

# PLAN NAVARRA 2012

12º Informe de Seguimiento

A 31 de diciembre de 2011

23 de febrero de 2012



**Gobierno  
de Navarra**

## PLAN NAVARRA 2012

SEGUIMIENTO 31 DE DICIEMBRE 2011

93 ACTUACIONES PRIORITARIAS: 2.719,4 M€

### INVERSIÓN REALIZADA ACUMULADA

1.878,2 M€

69%

DE LA INVERSIÓN TOTAL PREVISTA  
DEL PLAN (conclusión 31/12/2012)

93 ACTUACIONES PRIORITARIAS

		INVERSIÓN PREVISTA	INVERSIÓN REALIZADA
23	ACTUACIONES FINALIZADAS	666,2 M€	694,3 M€
40	OBRAS EN CONSTRUCCIÓN	1.166,7 M€	1.154,7 M€
1	OBRAS EN LICITACIÓN	5,5 M€	0,0 M€
7	PROYECTOS CONSTRUCCIÓN REDACTADOS	139,5 M€	10,2 M€
19	CON ACTUACIONES PREVIAS	206,3 M€	19,0 M€
3	PROYECTOS POSPUESTOS	15,1 M€	0,0 M€

## PLAN NAVARRA 2012

SEGUIMIENTO 31 DE DICIEMBRE 2011

# INVERSIÓN REALIZADA EN 2011

**385,1 M€**

PN2012 ACTUACIONES PRIORITARIAS	1ºT 2011	2ºT 2011	3ºT 2011	4ºT 2011
Inversión realizada (Millones de €)	78,8	102,4	101,7	102,2
Puestos de trabajo directos	3.030	3.154	3.449	2.290

93 ACTUACIONES PRIORITARIAS


PROGRAMACIÓN DE INVERSIÓN TOTAL	2.719,4 M€	
INVERSIÓN REALIZADA A 31.12.11	1.878,2 M€	69,1%
PREVISIÓN INVERSIÓN A 31.12.12 (Inversión en 2012 = 277,2 M€)	2.155,4 M€	79,3%
PREVISIÓN FINAL PLAN NAVARRA 2012 (Inversión finalización obras en 2013 = 31,2 M€)	2.186,6 M€	80,4%

**GRADO CUMPLIMIENTO FINAL (prev) = 80,4%**

# PLAN NAVARRA 2012

## SEGUIMIENTO 31 DE DICIEMBRE 2011

### EVOLUCIÓN DE LA INVERSIÓN ANUAL A LO LARGO DEL PLAN

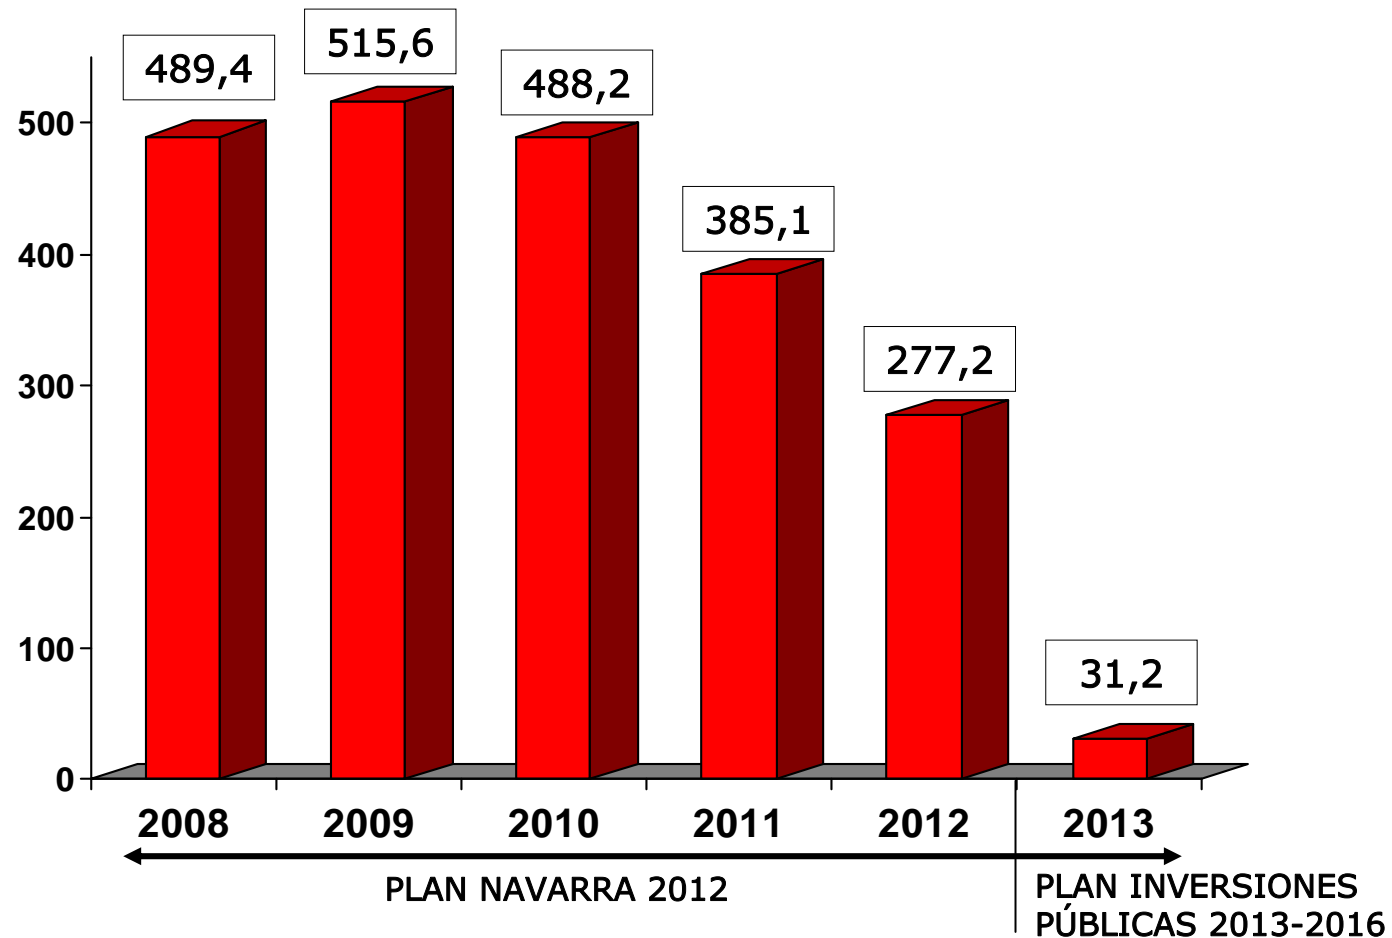

2.186,6 M€ = 80,4% DE LO PROGRAMADO
